

令和5年11月25日

ご近隣のみなさま

発注者：NECプラットフォームズ株式会社

施工者：株式会社フィールド・パートナーズ

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地における工事に係る  
進捗状況と今後の予定のお知らせ（第6回）


拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地におきまして実施中の建物等解体及び土壌汚染対策工事の進捗と今後の予定を以下にお知らせいたします。

工事期間中、ご近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き関係法令を遵守し、細心の注意を払い安全第一に努めて参りますので、ご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

■これまで（9月9日～11月8日）の工事進捗について

- ・下図の茶色の範囲（11工場の一部を除く各工場、北星寮など）について、重機による基礎杭引抜きが完了しました。引続き橙色の範囲（11工場）の基礎杭引抜きを11月末まで実施します。
- ・下図の青色の範囲にあった重金属類による汚染土壌については、9月までに場外搬出が完了しました。搬出先の愛知県の汚染土壌処理施設において適切な処理が終わったことを確認し、岩手県に工事完了報告書を提出しました。
- ・下図の緑色の範囲の揮発性有機化合物（VOC）類による汚染区画については、浅部の土壌を浄化する工事（ホットソイル処理）が完了しました。なお、施工中に行っていた大気モニタリングについて異常はありませんでした。
- ・深部のVOC類による汚染土壌を浄化するため、新たに注入用の小径井戸を設置し、地盤中にもともと生息している微生物に栄養剤を供給して活性化させ、汚染物質を分解する処理を11月17日に開始しました。

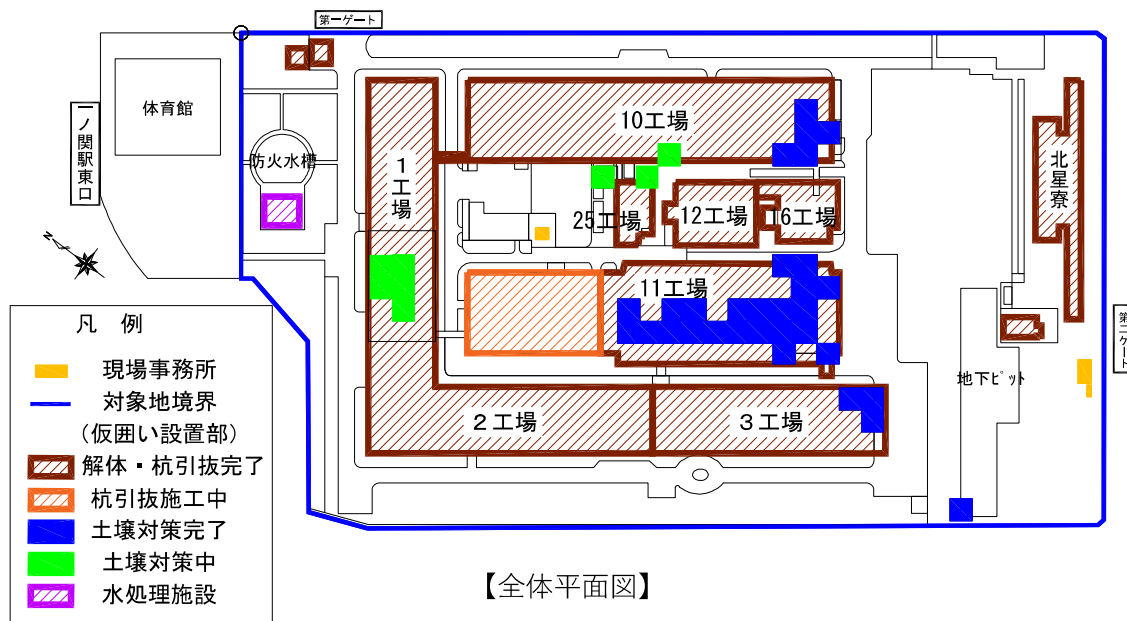

## ■進捗状況写真



【基礎杭引き抜き】



【ホットソイル処理掘削状況】



【栄養剤注入井戸設置状況】

## ■産業廃棄物処理の処分先について

- ・ 前回のお知らせ以後、新たな処理施設の追加はありません。  
既に契約を結んだ処理施設への搬出を継続しております。

## ■12月以降の工事予定

- ・ 11月末で解体1期工事（建物の解体）が完了となります。なお、解体用大型重機は、12月上旬に搬出します。作業に伴い運搬車両が行き交いますので、事故防止のため運転手への指導を徹底します。
- ・ 深部のVOC類による汚染土壌の浄化作業は、地盤中に生息する微生物に栄養剤を供給し、活性化させることで汚染物質を分解する方法を使用しています。この作業は来年6月頃まで継続する予定です。
- ・ 粉塵抑制のために高さ4メートルの粉塵抑制壁（シート及び当該シート上部にミスト発生機を取り付け、ミスト噴霧による散水）を設置してきましたが、建物の解体工事が完了したため、これを撤去する予定です。

## ■解体2期工事について

- ・ 令和7年12月頃から、解体2期工事として構内道路や駐車場の舗装の解体を開始する予定です。なお、当初は令和8年3月頃からの開始を予定していましたが、工期内完了を確実にするため、3ヶ月前倒しして開始することとしました。ご協力をお願い致します。
- ・ 解体2期工事の開始まで、令和6年7月から一時休工となりますが、地下水のモニタリングや敷地の管理のため、弊社および関係会社の作業員が適宜出入りする場合があります。予めご了承ください。

次回の工事予定のお知らせは、解体2期工事開始前（令和7年11月頃）にお知らせさせていただく予定です。ご不明な点につきましては、以下の施工会社担当までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

■お問い合わせ先 株式会社フィールド・パートナーズ 03-6268-8252
