

令和5年9月25日

ご近隣のみなさま

発注者：NECプラットフォームズ株式会社
施工者：株式会社フィールド・パートナーズ

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地における工事に係る
進捗状況と今後の予定のお知らせ（第5回）


拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地におきまして実施中の建物等解体及び土壌汚染対策工事の進捗と今後の予定を以下にお知らせいたします。

工事期間中、ご近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き関係法令を遵守し、細心の注意を払い安全第一に努めて参りますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■これまで（7月7日～9月8日）の工事進捗について

- ・下図の茶色の範囲（主に1・2・3工場、北星寮）について、重機による地上部解体及び土間基礎解体が完了し、基礎杭引き抜きを実施しています。
- ・下図の青色の範囲にあった重金属類による汚染土壌については、9月5日に場外への搬出が完了しました（重金属汚染32区画全てが完了）。現在、愛知県の汚染土壌処理施設において、適切な処理を進めております。
- ・下図の水色の場所に設置した大型テントにおいて、緑色の範囲から取り出した揮発性有機化合物（VOC）類による汚染土壌を、生石灰を加えて混ぜることで熱を発生させ、その熱でVOC類を蒸発・分離させて土壌を浄化する工事（ホットソイル処理）を開始しました。施工中は大気モニタリングを実施し、VOC類の大気への流出を防止しながら作業を進めます。

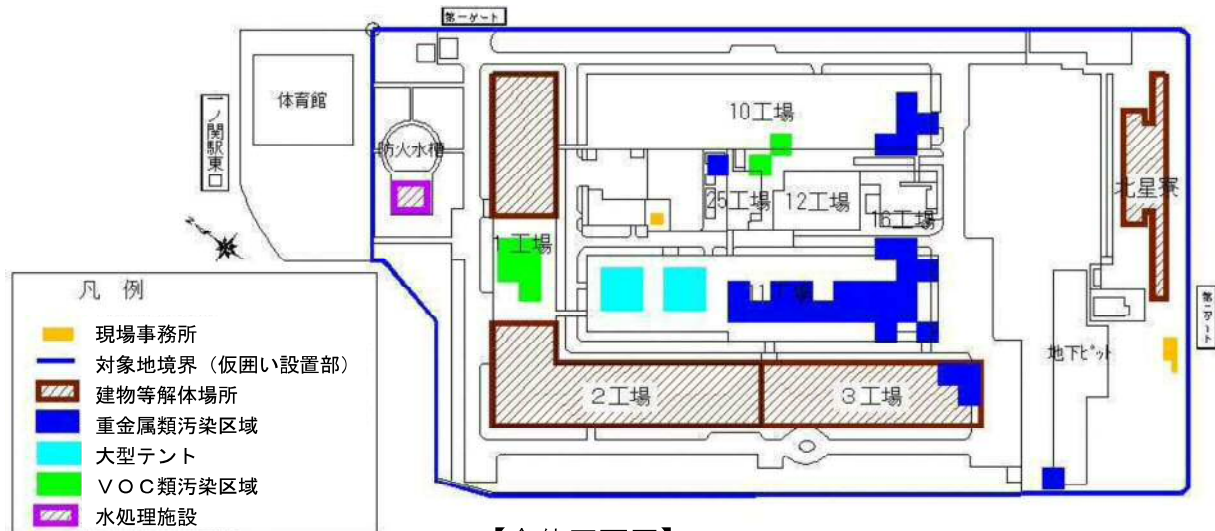

■進捗状況写真



【土間基礎解体】



【汚染土壌掘削除去】



【ホットソイル処理】

■産業廃棄物処理の処分先について

- ・ 前回のお知らせ以後、新たな処理施設の追加はありません。
既に契約を結んだ処理施設への搬出を継続しております。

■10月、11月度の工事予定

- ・ 引き続き土間基礎の解体と基礎杭引き抜きを進めます。11月末までに建物を解体し、解体1期工事が完了する予定です。なお、構内道路や駐車場の舗装を解体する解体2期工事については、令和8年3月頃より実施する予定です。
- ・ 解体廃材や資機材の搬出入などで運搬車両が行き交いますので、事故防止のため運転手への指導を徹底します。また、粉じん防止策として、シート養生や散水を継続し、粉じんの発生抑制を引き続き行います。
- ・ 土間基礎の解体にあたっては、振動・騒音計を確認しながら、近隣の皆様への影響を抑えるよう配慮して作業を進めます。
- ・ VOC類による汚染土壌のテント内でのホットソイル処理を継続します。
- ・ 11月頃より、深部のVOC類による汚染土壌を浄化するため、地盤中にもともと生息している微生物に栄養剤を供給して活性化させ、汚染物質を分解する処理を開始します。栄養剤注入用の井戸を設置し、微生物を活性化させる栄養剤を供給します。
- ・ 工事で発生した濁水等は、場内に設けた水処理施設で処理し、水質汚濁等の環境基準を満たすことを確認した上で、吸川に排水する処理を継続します。

次回は11月に工事予定のお知らせをさせていただく予定です。ご不明な点につきましては、以下の施工会社担当までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

■お問い合わせ先 株式会社フィールド・パートナーズ 03-6268-8252
