


(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年12月2日

計画の名称	一関市における循環のみちの実現																				
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)					交付対象	一関市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																				
計画の成果目標 (定量的指標)	① 下水道整備面積を75% (H22) から89% (H26) に増加させる。																				
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考										
						当初現況値 (H22当初) 中間目標値 (H24末) 最終目標値 (H26末)															
① 下水道整備面積	整備済み面積 (ha) / H21末認可面積					83% 85% 89%															
上段：計画 下段：実施																					
全体事業費	合計 (A + B + C)	5,798百万円	A	4,655百万円	B	0百万円	C	1,143百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	19.7%											
		4,197百万円		3,575百万円		0百万円		622百万円		14.8%											
事後評価																					
○事後評価の実施体制、実施時期																					
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期				平成28年10月											
上下水道部下水道課内にて事後評価を実施し、下水道事業等経営審議会において評価結果を報告。						公表の方法				一関市ホームページにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A 下水道																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
												H22	H23	H24	H25	H26					
一関処理区																					
12-A1-1-1	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	駅東処理分区 (未普及解消)	A=10.0ha A=10.8ha	一関市						138	172				
12-A1-1-2	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	中里処理分区 (未普及解消)	A=11.0ha A=13.7ha	一関市						186	299				
12-A1-1-3	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	一関南処理分区 (未普及解消)	A=69.0ha A=71.4ha	一関市						1,436	936				
12-A1-1-4	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	山目処理分区 (未普及解消)	A=44.0ha A=52.7ha	一関市						1,704	1,045				
12-A1-1-5	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	効率的な事業実施のための計画策定	A=1783ha A=1674ha	一関市						24	11				
花泉処理区																					
12-A1-2-1	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	金沢地区 (未普及解消)	A=9.3ha A=7.2ha	一関市						244	285				
12-A1-2-2	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	花泉地区 (未普及解消)	A=5.1ha A=6.8ha	一関市						178	53				
大東処理区																					
12-A1-3-1	下水道	一般	一関市	直接	—	汚泥	新設	摺沢浄化センター (汚泥処理施設)	汚泥引抜ポンプ、流量計 汚泥引抜ポンプ、流量計	一関市						20	19				
千厩処理区																					
12-A1-4-1	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	千厩地区 (未普及解消)	A=36.9ha A=27.1ha	一関市						571	666				
12-A1-4-2	下水道	一般	一関市	直接	—	処理場	新設	千厩浄化センター (水処理施設)	水処理機械・電気・汚泥脱水 1,000m3/日 水処理機械・電気・汚泥脱水 1,000m3/日	一関市						134	68				
東山処理区																					
12-A1-5-2	下水道	一般	一関市	直接	—	污水管	新設	南磐井里地区 (未普及解消)	A=1.0ha A=0.6ha	一関市						20	21				
合計																		4,655	3,575		

B 関連社会資本整備事業																							
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考						
											H22	H23	H24	H25	H26								
											合計												
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考						
C 効果促進事業				上段：計画 下段：実施																			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考						
											H22	H23	H24	H25	H26								
一関処理区																							
12-C-1-1	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	駅東処理分区枝線整備	A=2.0ha A=0.0ha	一関市						27 0							
12-C-1-2	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	中里処理分区枝線整備	A=3.0ha A=1.3ha	一関市						37 49							
12-C-1-3	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	一関南処理分区枝線整備	A=17.9ha A=18.1ha	一関市						482 226							
12-C-1-4	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	山目処理分区枝線整備	A=12.0ha A=10.0ha	一関市						526 293							
花泉処理区																							
12-C-2-1	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	金沢地区枝線整備	A=1.9ha A=1.6ha	一関市						38 42							
12-C-2-2	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	花泉地区枝線整備	A=0.3ha A=1.5ha	一関市						12 5							
千厩処理区																							
12-C-4-1	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	千厩地区枝線整備	A=4.0ha A=1.1ha	一関市						20 7							
東山処理区																							
12-C-5-1	下水道	一般	一関市	直接	－	污水管	新設	南磐井里地区枝線整備	A=0.1ha A=0.0ha	一関市						1 0							
															合計	1,143 622							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考						
12-C-1-1	基幹事業である幹線（12-A1-1-1）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						
12-C-1-2	基幹事業である幹線（12-A1-1-2）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						
12-C-1-3	基幹事業である幹線（12-A1-1-3）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						
12-C-1-4	基幹事業である幹線（12-A1-1-4）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						
12-C-2-1	基幹事業である幹線（12-A1-2-1）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						
12-C-2-2	基幹事業である幹線（12-A1-2-2）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						
12-C-4-1	基幹事業である幹線（12-A1-4-1）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						
12-C-5-1	基幹事業である幹線（12-A1-5-2）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																						

(参考様式3) (参考図面)

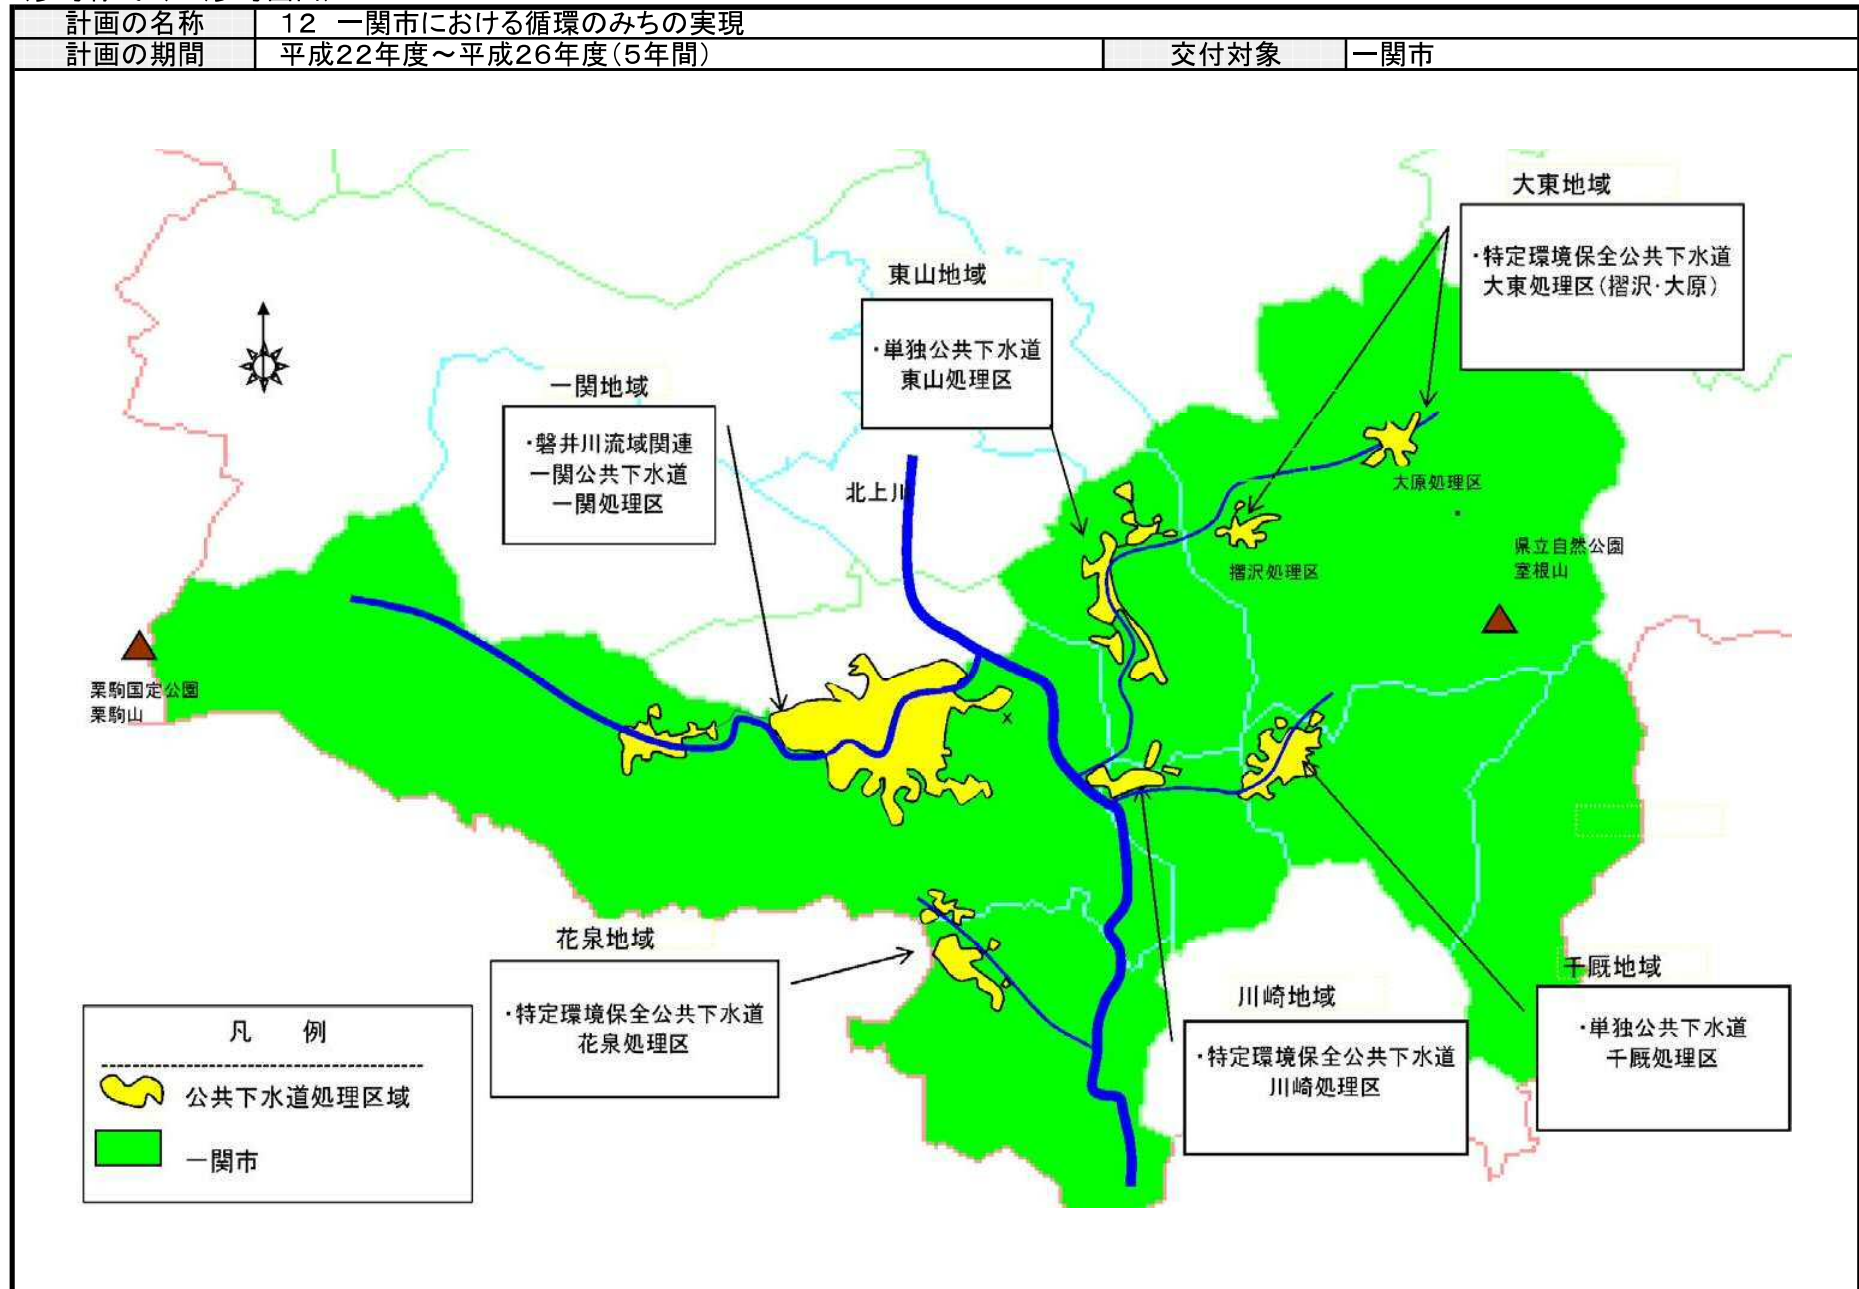

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	12 一関市における循環のみちの実現		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	一関市

一 関 処 理 区

(省略)

凡例1 (全体計画)	
公共下水道事業	
農業集落排水事業	

凡例2 (各年度の整備区域)	
全体計画区域	
認可計画区域	
既整備区域	
既設幹線	
新設	
改築	

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	12 一関市における循環のみちの実現		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	一関市

花 泉 処 理 区

(省略)

凡	例
全体計画区域	
認可計画区域	
既整備区域	
既設幹線	
新設	
改築	

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	12 一関市における循環のみちの実現		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	一関市

大東処理区

(省略)

凡 例	
全体計画区域	
認可計画区域	
既整備区域	
既設幹線	
新 設	

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	12 一関市における循環のみちの実現		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	一関市
千厩処理区 (省略) 全体計画区域 認可計画区域 既整備区域 新設整備区域 既設幹線			

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	12 一関市における循環のみちの実現		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	一関市
東山処理区 (省略)			
